

Beschaffung der E-Bus-Ladestation Höllriegelskreuth


12. Besprechung zur E-Bus-Ladestation Höllriegelskreuth

Arbeitsmeeting, Online, 26.07.2023


Betriebskonzept



Vorplanung

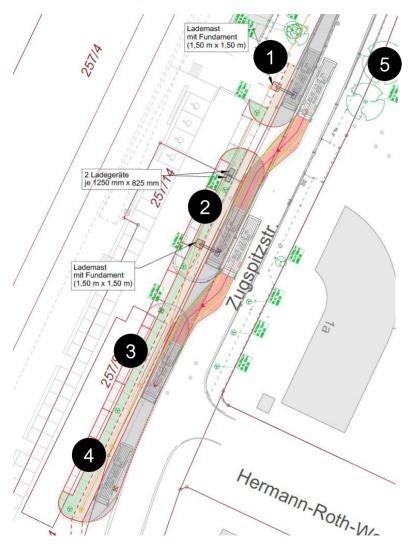


Bestand:

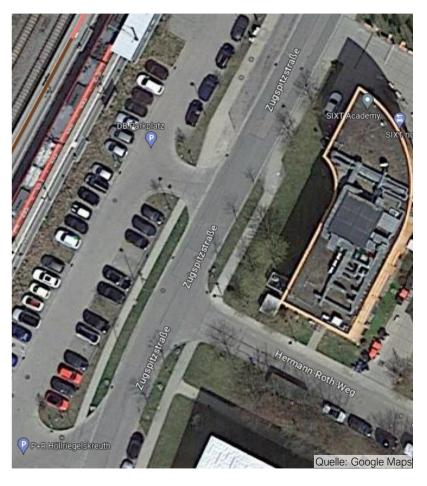




Belegung der Bushaltebucht am S-Bhf. Höllriegelskreuth

» Planmäßige Belegung (wochentags):

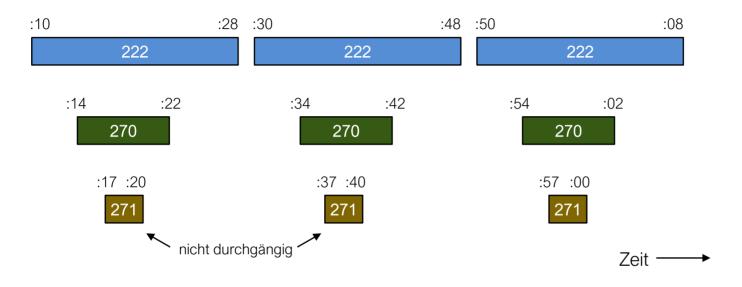

» Evtl. zukünftig weitere Linien (insbes. MVV-Freizeitlinie)


Potenzielle Ladezeit am S-Bhf. Höllriegelskreuth

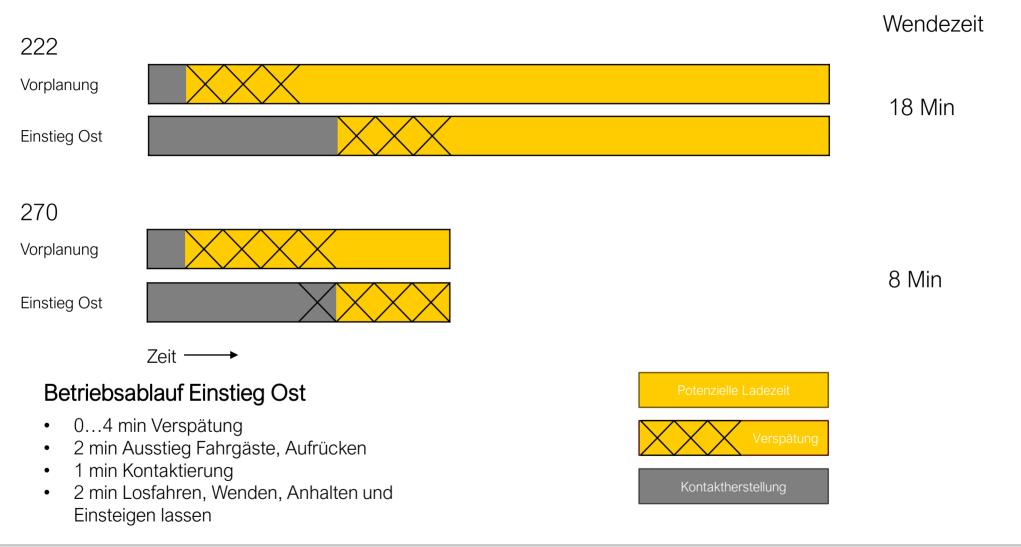




Ergebnisse Energiebilanzierung

222

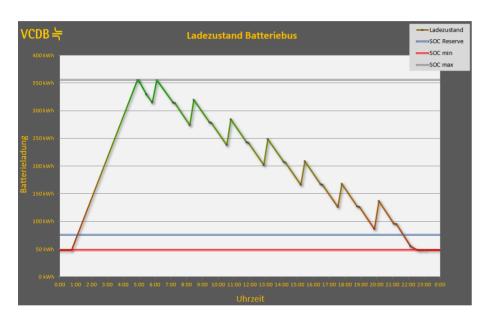


270

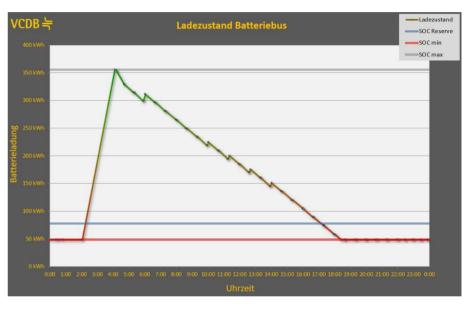




Entwurfsplanung



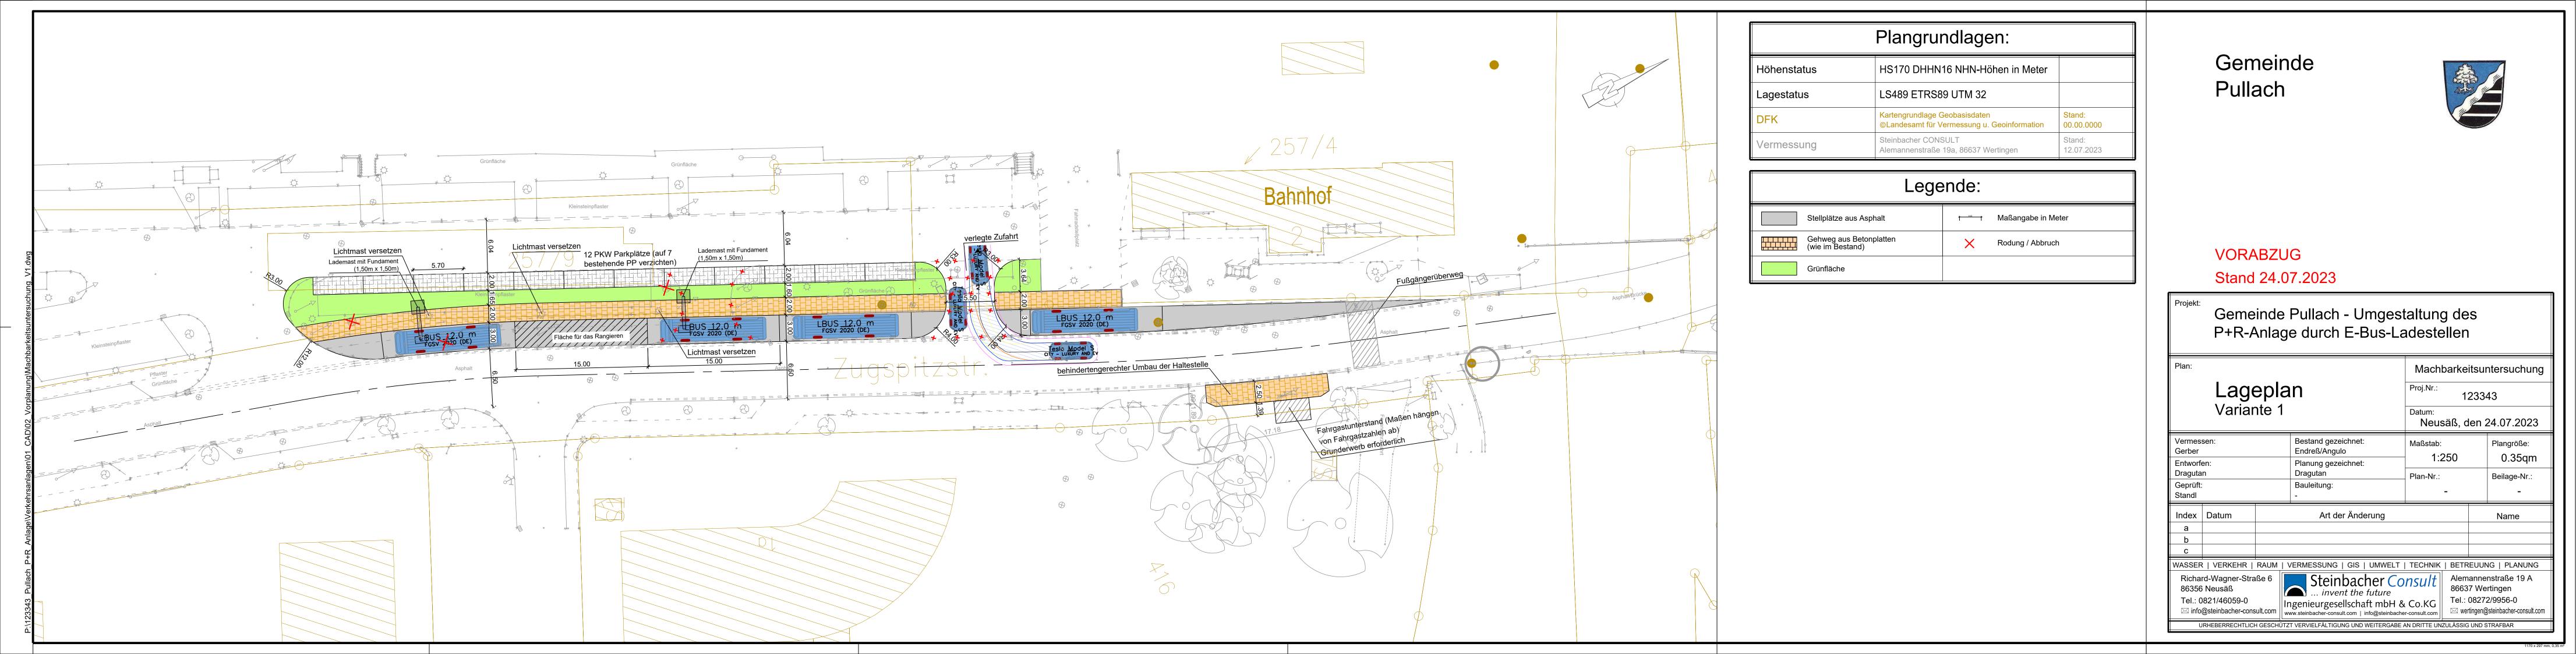

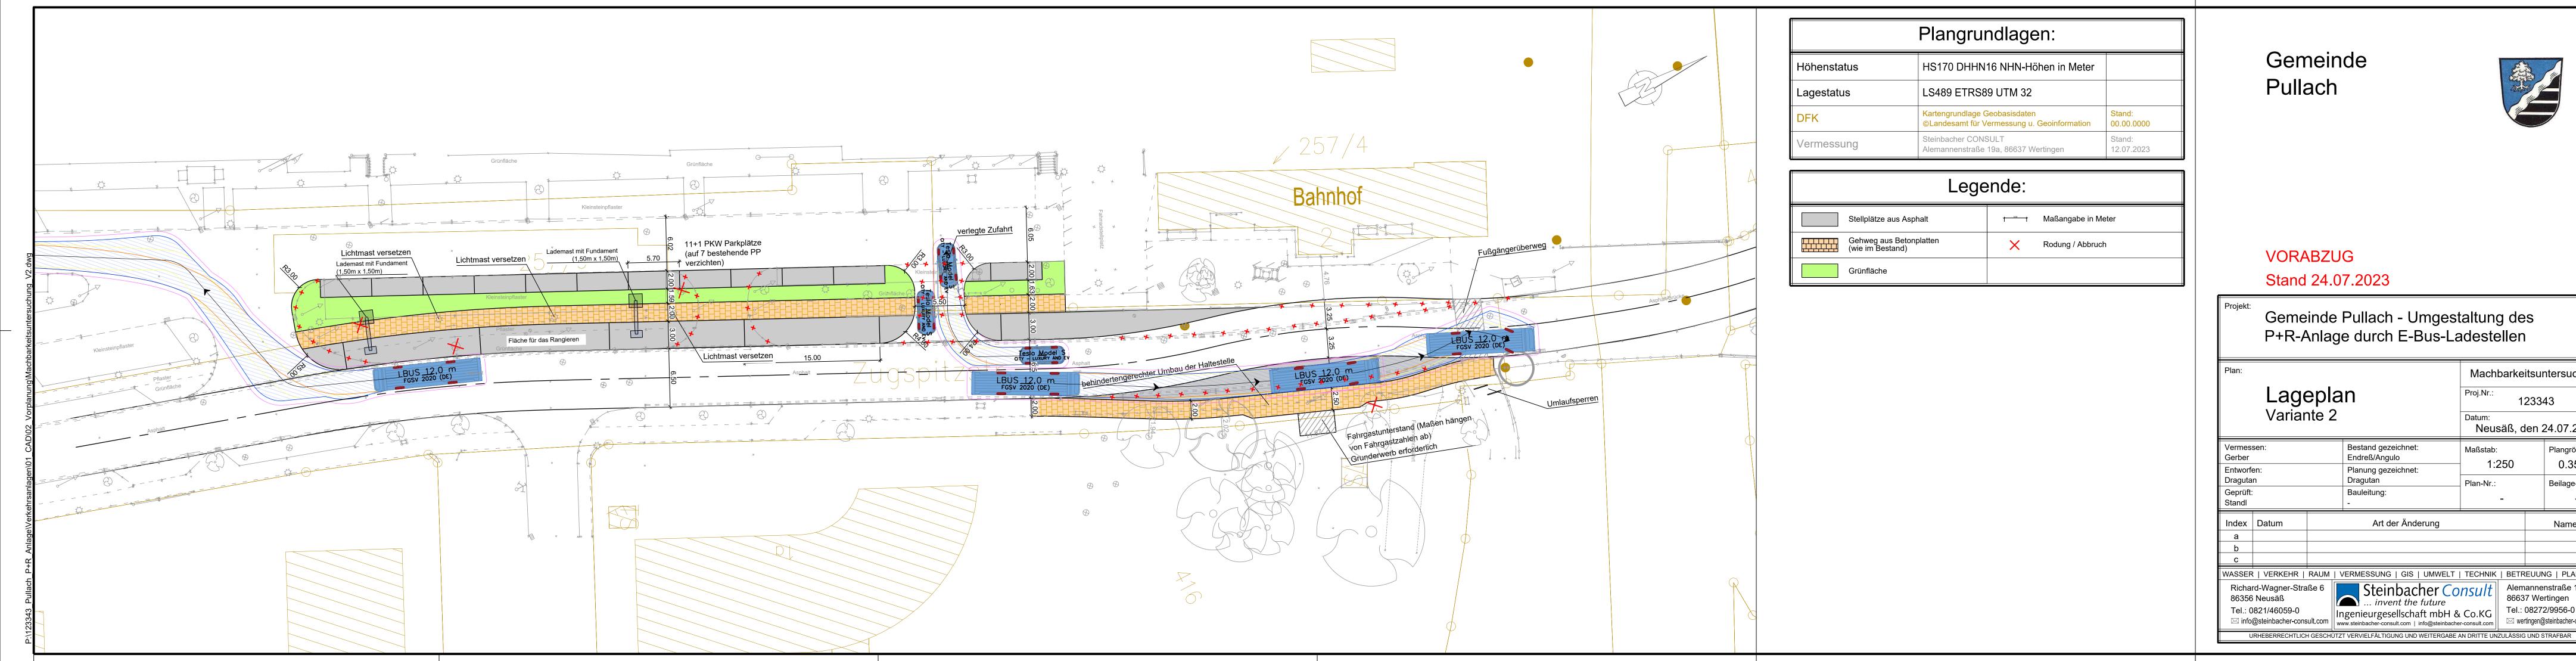



Gemeinde Pullach - Umgestaltung des P+R-Anlage durch E-Bus-Ladestellen

Machbarkeitsuntersuchung 123343 Neusäß, den 24.07.2023

Art der Änderung

Zeitplan, Dokumente



Zeitplan

Aufgabe	Zuständig	Zeitraum
Ausschreibung LIS Höllriegelskreuth		
Erstellung Vergabeunterlagen	VCDB	07-08/2023
Veröffentlichung Ausschreibung	Gemeinde	10/2023
Zuschlagserteilung	Gemeinde	12/2023
Ausschreibung Fahrzeuge und LIS Betriebshof		
Erstellung Vergabeunterlagen	VCDB	07-08/2023
Veröffentlichung Ausschreibung	VU	09/2023
Zuschlagserteilung	VU	12/2023
Planung und Ausschreibung Tiefbau		
Entwurfsplanung	Steinbacher	08/2023
Ausführungsplanung	Steinbacher/AN LIS	01-03/2024
Ausschreibung	Steinbacher/Gemeinde	2024
Umsetzung LIS Höllriegelskreuth		
Umbau P+R-Anlage	AN Tiefbau	2024/2025
Errichtung Trafo	Bayernwerk	2024
Errichtung LIS	AN LIS	2024/2025
Inbetriebnahme LIS	AN LIS/VCDB	03/2025
Betriebsaufnahme		
Probebetrieb	VCDB/VU	04-06/2025
Aufnahme Regelbetrieb	VU	01.07.2025

LIS = Ladeinfrastruktur

VU = Verkehrsunternehmen

AN = Auftragnehmer

Spätestens mit Erteilung der Zuschläge für LIS und Fahrzeuge muss der Bauvertrag zwischen Gemeinde und DB unterschrieben sein!



Abstimmung Erstellung Dokumente Entwurfsplanung / Vergabeverfahren

Dokument	Ersteller	Bis Wann	Übermittlung An
Entwurfsplanung Lageplan	Steinbacher Consult	04.08.2023	Gemeinde
Bauvoranfrage Erläuterungsbericht	Steinbacher Consult / VCDB	11.08.2023	DB
Kostenschätzung LIS	VCDB	11.08.2023	Gemeinde
Lastenheft LIS	VCDB	16.08.2023	Gemeinde
EBA Anfrage Sachbereich 1	VCDB	18.08.2023	EBA
Kostenschätzung Bau	Steinbacher Consult	16.08.2023	Gemeinde

